

▶ प्रगति  
Jan 2021




प्रधानमंत्री  
आवास योजना  
(शहरी) उ०प्र०



नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ०प्र०



राज्य नगरीय विकास अभिकरण  
(सूडा) उ०प्र०



प्रधान मंत्री आवास योजना  
(शहरी)



## अनुक्रमणिका

सम्पादक की कलम से.....	04
विचार.....	05
उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार-2019.....	06
सर्वश्रेष्ठ पूर्ण आवास हेतु पुरस्कार-2019 एवं सफलता की कहानी.....	07
लाइट हाऊस प्रोजेक्ट-लखनऊ.....	08-09
मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंगल क्लिक से धनराशि हस्तान्तरित.....	10-11
जनपदवार श्रेणी.....	12-20
➤ ग्राउण्डिंग	
➤ द्वितीय किशत	
➤ पूर्ण लेवल	
➤ रूफ लेवल	
➤ सम्पूर्ण प्रगति	
माह का सर्वश्रेष्ठ आवास.....	21
माह जनवरी में आई0ई0सी0 कार्यकलाप.....	22



# सम्पादक की कलम से

साथियों,

सबसे पहले आप सभी को नववर्ष मंगलमय हो। साथ ही आशा करते हैं कि आप सभी नए साल में नई उमंग एवं उत्साह से कार्य करेंगे। राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा माह मार्च, 2020 तक 08 लाख 50 हजार आवासों को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अवार्ड-2019 में उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने पर बहुत-बहुत बधाई देते हैं। इसी प्रकार आगामी वर्ष में भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने हेतु हम सभी को भरसक प्रयास करना होगा, जिसके लिए 8 लाख 50 हजार आवासों को पूर्ण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

उक्त के क्रम में 9,28,206 आवासों का प्रथम चरण का जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष मात्र 7,79,607 लाभार्थियों को ही प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इसी प्रकार 6,74,609 आवासों का द्वितीय चरण का जियो टैग किया गया है तथा 6,57,801 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिससे लक्ष्य को प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है। द्वितीय किस्त अवमुक्त किए गए लाभार्थियों के आवासों को पूर्ण कराते हुए तृतीय किस्त अवमुक्त कराना सुनिश्चित करें। इस हेतु नियमित अनुश्रवण की आवश्यकता है।

(अतुल सिंह चौहान)  
सम्पादक

(योगेश आदित्य)  
सह सम्पादक



# विचार



सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अवार्ड-2019 में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिका परिषद की श्रेणी में मिर्जापुर नगर पालिका परिषद को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पंचायत की श्रेणी में महिलाबाद नगर पंचायत को प्रथम तथा हरिहरपुर नगर पंचायत को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। इसके लिए मैं समस्त परियोजना अधिकारियों, सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर्स एवं डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट्स को बधाई देता हूँ।

— उमेश प्रताप सिंह, निदेशक



आप सभी को नववर्ष की बधाई। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अवार्ड-2019 पुरस्कार प्रदान किए जाने पर समस्त परियोजना अधिकारीगण, सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर्स एवं कन्सलटेन्ट्स बधाई के पात्र हैं। सभी के द्वारा पूर्ण लगन एवं मेहनत से कार्य किया गया है, जिस कारण प्रदेश को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही अपेक्षा करता हूँ कि मिशन अवधि में लक्ष्य को पूर्ण कर लें, जिससे भविष्य में भी प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो सके।

— आलोक सिंह, अपर निदेशक



भारत सरकार द्वारा प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अवार्ड-2019 प्रदान किया जाना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। आगे भी समस्त परियोजना अधिकारी एवं सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर्स यह सुनिश्चित करें कि पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को त्रुटिरहित भुगतान समय से एवं पारदर्शी तरीके से संभव हो सके। पुनः मैं सभी को टीम भावना से अनवरत एवं लगन से कार्य करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अवार्ड-2019 प्राप्त करने हेतु बधाई एवं शुभकामना देता हूँ।

— सम्पूर्णानन्द द्विवेदी, वित्त नियंत्रक



मा0 प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार प्रदेश में 'सबका सपना घर हो अपना' के सूत्र वाक्य को जमीनी स्तर पर सच किया गया, उसी का परिणाम प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पुरस्कार 2019 है। इस पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की पूरी टीम बधाई की पात्र है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बी0एल0सी0 के अतिरिक्त अन्य घटकों में भी हमारी टीम नए कीर्तिमान बनाते हुए हर प्रकार के आवासों की पहुँच उनके लाभार्थियों तक कराएगी और उत्तर प्रदेश में कोई भी बेघर नहीं रहेगा।

— पूजा अग्निहोत्री, सहायक निदेशक

# शहरी गरीबों को पक्का मकान देने के लिए उत्तर प्रदेश बना न. 1



Best Nagar Palika Parishad Mirzapur



Best Nagar Panchayat Malihabad

**BEST HOUSE AWARDS IN UP**  
Shrimati Chandrawati - Lucknow  
Shri Sushil - Azamgarh  
Shri Rajendra - Hapur



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि हर व्यक्ति के मन में हमेशा एक इच्छा रहती है कि उसका अपना खुद का घर हो, प्रधानमंत्री जी की भावना का सम्मान देते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रयास किए गए और उसी प्रयास का परिणाम है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान का पुरस्कार मा0 प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नव वर्ष के दिन अर्थात् 01.01.2021 को प्रदेश के मुखिया मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर एवं नगर पंचायत, मलिहाबाद को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिका एवं नगर पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के तीन लाभार्थियों क्रमशः श्रीमती चन्द्रावती, लखनऊ, श्री सुशील, आजमगढ़ एवं श्री राजेन्द्र, हापुड़ के आवासों को उत्कृष्ट पूर्ण आवास की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के मार्ग प्रदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के हेतु नोडल एजेन्सी राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ0प्र0 का संकल्प है कि आगामी वर्षों में भी उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान पर बनाए रखना है।

नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टण्डन ने कहा है कि भविष्य में भी यह प्रयास किया जाएगा कि केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हो।

## लाभार्थियों को पुरस्कार एवं सफलता की कहानी



Smt. Chandrawati  
Lucknow

चंद्रावती लखनऊ से कहती है की उनके पति का नाम राजू प्रजापति है और उनके ३ बच्चे है वो बताती है की पहले हम किराये के मकान पर रहते थे। डूडा कार्यालय से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बारे में पता चला और हमने उक्त योजनांतर्गत आवेदन किया और आज उनके पास खुद का पक्का आवास है। जिससे वह और उनका परिवार बहुत खुश हैं, हमारे जीवन यापन के स्तर में वृद्धि हुई है आज के समय में हमें अपना घर बनाने की विन्ता नहीं है। हम अपना जीवन सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने मालिक होने पर हम बहुत गर्व महसूस करते है। अब हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं। वो कहती की वो सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने घर बनाने की ऐसी योजना बनाई जिससे गरीबों का अपने घर में रहने का सपना पूरा हो रहा है।

श्री सुशील आजमगढ़ नगर पंचायत महादेव नगर के रहने वाला हैं। मेरे परिवार में कुल नौ सदस्य हैं। उनका पुराना कच्चा मकान क्षतिग्रस्त स्थिति में था, उनके मकान में बरसात के मौसम में पानी टपकता था। दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से योजना के बारे में पता चला, उसके पश्चात् उन्होंने आवेदन किया। कुछ महीनों बाद हमारे खाते में तीन किशतों में ₹0 2.50 लाख की धनराशि प्रदान की गयी। जिससे मैने डूडा के कर्मचारियों के निर्देशानुसार अपने घर में कुछ सहयोग से चार रूम, किचन, एक बरामदा एवं शौचालय का निर्माण करवाया तथा अब हमें अपने घर में किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। अब हमें अपने घर में किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। मैं और मेरा परिवार अब सकुशल जीवन यापन करते हैं। मेरा परिवार मा0 प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0, श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हैं।

Shri Sushil  
Azamgrah




Shri Rajendra  
Hapur

हापुड़ मे रहने वाला श्री राजेंद्र पुत्र स्व0 सरजीत सिंह आदर्शनगर कालोनी जिला हापुड़ में रहता है। वो कहता है पहले हमारे पास छोटा सा एक कमरा था जिसमें मेरा परिवार रहता था। जिससे हमें बहुत परेशानियां थीं, नगर पंचायत हापुड़ के द्वारा हमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई जिसके उपरान्त हमने आवेदन किया। वर्तमान में मेरे पास रहने के लिए खुद का पक्का आवास है। जिससे मैं और मेरा परिवार खुशी से रहते हैं, और अपना जीवन सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने मालिक होने पर हम बहुत गर्व महसूस करते है। जिससे मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। जब से हमारा पक्का मकान बना है सगे सम्बन्धी व मौहल्ले के लोगो द्वारा भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सम्मान होने पर मैं एवं मेरा परिवार अपने आप को गौरान्वित महसूस करते है।

## नव वर्ष पर लखनऊ वासियों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा



आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नोलॉजी चैलेन्ज-इण्डिया के अन्तर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसका शिलान्यास मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 01.01.2021 को किया गया है। अब राजधानी लखनऊ में भी कम आय वर्ग के लोगों का फ्लैट में रहने का सपना पूरा हो सकेगा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत शहीद पथ पर अवध विहार में यह 13 मंजिला भवन तैयार हो रहे हैं। फ्लैट में रहने वालों को बिजली एवं पानी की सुविधा मिलेगी। साथ ही बेहतर सीवरेज सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत कुल 13090.00 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। जिससे 1040 फ्लैट का निर्माण किया जायेगा। लखनऊ में अवध विहार सेक्टर-पांच में भूखंड संख्या जी-एच-4 की दो हेक्टेयर भूमि पर इसका निर्माण हो रहा है। यहां पर आवास विकास परिशद की तरफ से पहले से ही सड़क, सीवर, जलपूर्ति और बिजली की व्यवस्था है। इसके तहत किफायती दामों पर फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत वर्ग के कम आय वर्ग के लोग भी से फ्लैट में रहने का अधूरा सपना भी पूरा कर सकेंगे।

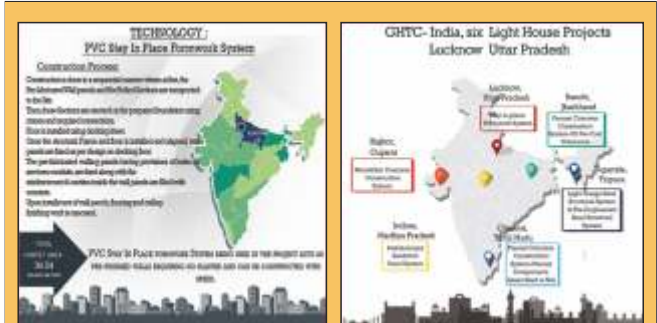

- ★ निर्माण लागत ₹ 130.90 करोड़
- ★ कारपेट एरिया 34.50 वर्गमी0
- ★ कुल 1040 नग भवन
- ★ एस+13 बहुमंजिला भवन
- ★ फ्लैट का एरिया 415 वर्ग0फिट
- ★ साकार से मिलने वाला अनुदान ₹ 7.83 लाख
- ★ कोई अपना आवास नहीं होना चाहिए

कम आय वाले लोगों का फ्लैट में रहने का सपना पूरा करेगा 'लाइट हाउस प्रोजेक्ट' शहीद पथ पर अवध विहार में 13 मंजिला भवन ₹ 13090.00 लाख की लागत से बनेगा



# LIGHT HOUSE PROJECT



12.5865 लाख की लागत से तैयार होने वाले यह फ्लैट लाभार्थी को मात्र 4.75 लाख रुपये में मिलेंगे। सालाना तीन लाख तक की आय वाले ही फ्लैट पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। देश के छः राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुमंजिल भवनो का निर्माण किया जा रहा है इसके लिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ का चयन किया गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट सेक्टर-5 अवध विहार, लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा चुका है। इस योजना में केन्द्र और राज्य सरकार का अंश 7.83 लाख रुपये होगा। हालांकि लाभार्थी को मात्र 4,75,654 रुपये ही देना होगा। यह राशि लाभार्थी से आवंटन के बाद ली जाएगी और बैंक से लोन दिलाने की भी योजना इसके लिए बनाई गई है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का 15 अप्रैल से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। योजना में अधिक लाभार्थी आने पर लाटरी से फ्लैट का आवंटन किया जाएगा। लखनऊ में इस पर निर्माण के लिए मेसर्स जैम सस्टेनेबल हाउसिंग एलएलपी का चयन किया गया है। जिसको तीन माह में अनापत्तियां और क्लीयरेंस प्राप्त करते हुए शेष बारह माह में इसका निर्माण पूरा करना होगा। मध्य प्रदेश में इंदौर, तमिलनाडू में चेन्नई, गुजरात में राजकोट, झारखंड में राची, त्रिपुरा में अगरतला, उत्तर प्रदेश में लखनऊ। देश में कुल चौदह राज्यों ने लाइट हाउस बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें छः राज्य का चयन किया गया।



**AT LUCKNOW  
UTTAR PRADESH**

## प्रधानमंत्री आवास योजना के 3.43 लाख लाभार्थियों के खाते में पहुंचे 2409 करोड़



मा0 मुख्यमंत्री ने कहा कि हर लाभार्थी के मन में अपना घर होने की इच्छा रहती है, अपना घर पाकर उनके चेहरे पर खुशी झलक रही है।

मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 27 जनवरी को गोरखपुर के एनेक्सी भवन से प्रदेश के 75 जिलों के 3,42,322 लाभार्थियों को सौगात दी गयी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लाभार्थियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2409 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर की गयी। इस कार्यक्रम में नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन और राज्य मंत्री महेश गुप्ता भी मौजूद थे। मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, सहारनपुर, एवं गाजियाबाद के 10 लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया।

उन्होंने बड़े ही आत्मीयता के साथ आवास निर्माण की जानकारी ली। उनके परिजनों के बारे में भी पूछा, बच्चों के पठन-पाठन की जानकारी ली तथा उनको

आजीविका मिशन से जुड़कर स्वयं को स्वावलंबी बनाए जाने हेतु प्रेरित किया। सरकार की योजनाओं के साथ जुड़कर अपने परिवार की आय बढ़ाए। मा0 मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर के 10 लाभार्थियों को आवास की चाभी भी सौंपी। कार्यक्रम का प्रसारण ऑनलाइन किया गया। प्रदेश के सभी एनआईसी सभागार, मा0 मुख्यमंत्री जी लाभार्थियों के साथ, सब स्थानीय जन प्रतिनिधि भी मौजूद थे। सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र भी दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में स्वीकृत अवासों के सापेक्ष 927781 अवासों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 567116 आवास पूर्ण हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक प्रदेश के सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का आवास प्रदान करके प्रधानमंत्री की परिकल्पना सबके लिए आवास को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।



इस योजना का समयावधि में घरों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। मा0 मुख्यमंत्री ने कहा कि हर लाभार्थी के मन में अपना घर होने की इच्छा रहती है, अपना घर पाकर उनके चेहरे पर खुशी झलक रही है। सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को लाभान्वित करा रही है। यह सब उपलब्धियां प्रदेश के अन्दर टीम वर्क का परिणाम है। उन्होंने लाभार्थियों, जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि जिन लाभार्थियों को जिस मद में धनराशि दी जा रही है, उस धनराशि का प्रयोग उसी कार्य पर हो और नोडल अधिकारी नामित करते हुए सहज एवं सस्ते दर पर भवन सामग्री लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाये तथा कार्यों की समीक्षा साप्ताहिक की जाये।



प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये मिलते हैं। इसमें पहली किस्त के रूप में 50 हजार, दूसरी किस्त में 1.50 लाख और तीसरी किस्त में 50 हजार रुपये मिलते हैं। एनेक्सी भवन सभागार में होने वाले कार्यक्रम में प्रथम और द्वितीय किस्त के 150 लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया। इन्हें मा0 मुख्यमंत्री जी के कर कमलो द्वारा योजना का प्रमाण पत्र दिलाया गया।



# District Wise Ranking (House Grounding)

Progress Report of Total Grounded Houses in a Month (1st Jan 2021 to 31st January 2021)								
Sr. No.	District	Sanctioned DU's	Curtailment count (tentative Apatra Count)	Revised Sanctioned DU's (Patra Count)	Total Grounded Houses Till 1st Jan 2021	Total Grounded Houses Till 31st Jan 2021	Total Progress( During 1st Jan to 31st Jan 2021)	Rank
1	Ghaziabad	32029	7340	24689	20053	21582	1529	1
2	Varanasi	26544	7777	18767	17222	17721	499	2
3	Sitapur	28838	4677	24161	19576	20941	1365	3
4	Firozabad	46113	14452	31661	25498	26604	1106	4
5	Lucknow	26651	5984	20667	16425	17306	881	5
6	Hardoi	15670	938	14732	10406	11780	1374	6
7	Muzzaffarnagar	23244	6260	16984	12102	13389	1287	7
8	Meerut	20550	6150	14400	10794	11620	826	8
9	Amroha	17865	7212	10653	8973	9034	61	9
10	Hathras	11964	4657	7307	6177	6177	0	10
11	Maharajganj	17629	1482	16147	9692	11526	1834	11
12	Ghazipur	14396	5605	8791	7330	7330	0	12
13	Lakhimpur Kheri	24656	1871	22785	18885	18919	34	13
14	Mirzapur	37838	6416	31422	17884	20466	2582	14
15	Gorakhpur	43446	11677	31769	25929	26028	99	15
16	Lalitpur	18392	2671	15721	12888	12888	0	16
17	Shrawasti	5731	570	5161	4215	4215	0	17
18	Fatehpur	12127	4112	8015	5839	6283	444	18
19	Rae Bareli	11228	3061	8167	6218	6485	267	19
20	Gonda	7800	2630	5170	3778	4012	234	20
21	Saharanpur	31559	7543	24016	12165	14609	2444	21
22	Baghpat	10513	799	9714	7235	7247	12	22
23	Gautam Buddha Nagar	2181	397	1784	1234	1320	86	23
24	Pilibhit	22807	1849	20958	12418	13661	1243	24
25	Kanpur Nagar	11355	1762	9593	7059	7059	0	25
26	Basti	16709	2557	14152	7444	8928	1484	26
27	Shamli	20831	5239	15592	11012	11170	158	27
28	Ambedkar Nagar	16136	1511	14625	9303	9919	616	28
29	Prayagraj	20961	5366	15595	9824	10483	659	29
30	Bara Banki	18959	3550	15409	9077	10032	955	30
31	Mathura	35377	3590	31787	17237	18950	1713	31
32	Farrukhabad	7045	725	6320	4468	4468	0	32
33	Kannauj	11202	2850	8352	5827	5843	16	33
34	Jalaun	16780	3295	13485	8492	8927	435	34
35	Bulandshahr	41087	3864	37223	23240	23839	599	35
36	Moradabad	27862	7560	20302	13712	13742	30	36
37	Deoria	25796	2712	23084	13298	14206	908	37
38	Aligarh	29361	6040	23321	14746	15132	386	38
39	Banda	17169	2865	14304	9227	9415	188	39
40	Unnao	29058	3418	25640	14702	15602	900	40
41	Bareilly	23277	2860	20417	9456	11162	1706	41
42	Etawah	7609	1628	5981	3911	3919	8	42
43	Sultanpur	6975	1764	5211	3355	3398	43	43
44	Kushinagar	37322	4212	33110	18022	19071	1049	44
45	Bijnor	34328	6574	27754	16164	16696	532	45
46	Amethi	7254	667	6587	4155	4160	5	46
47	Hamirpur	10229	1835	8394	4405	4973	568	47
48	Kasganj	12200	2863	9337	5831	5847	16	48
49	Auraiya	11718	2611	9107	5712	5712	0	49
50	Jhansi	29628	2642	26986	16834	16834	0	50

# District Wise Ranking (House Grounding)

Progress Report of Total Grounded Houses in a Month (1st Jan 2021 to 31st January 2021)								
Sr. No.	District	Sanctioned DU's	Curtailement count (tentative Apatra Count )	Revised Sanctioned DU's (Patra Count)	Total Grounded Houses Till 1st Jan 2021	Total Grounded Houses Till 31st Jan 2021	Total Progress( During 1st Jan to 31st Jan 2021)	Rank
51	Shahjahanpur	16114	887	15227	7937	8505	568	51
52	Sonbhadra	11265	588	10677	6236	6316	80	52
53	Chandauli	13278	3063	10215	5931	5961	30	53
54	Mainpuri	17162	3802	13360	7533	7648	115	54
55	Sambhal	9125	1663	7462	4032	4216	184	55
56	Chitrakoot	6935	279	6656	3800	3821	21	56
57	Hapur	8012	925	7087	4016	4052	36	57
58	Bhadohi	31607	2853	28754	12624	13899	1275	58
59	Bahraich	12323	2323	10000	5259	5485	226	59
60	Budaun	17515	344	17171	8988	9231	243	60
61	Pratapgarh	14091	2253	11838	6386	6386	0	61
62	Mau	19886	1526	18360	9847	9849	2	62
63	Siddharthnagar	12557	2246	10311	4801	5133	332	63
64	Agra	49593	6849	42744	21945	21973	28	64
65	Ballia	24713	2595	22118	11383	11383	0	65
66	Mahoba	14601	1466	13135	6189	6455	266	66
67	Etah	9761	1699	8062	4075	4090	15	67
68	Jaunpur	28867	1572	27295	9858	10823	965	68
69	Rampur	23319	1996	21323	9344	9479	135	69
70	Kaushambi	12755	1428	11327	5053	5059	6	70
71	Balrampur	5318	427	4891	2153	2153	0	71
72	Sant kabir nagar	20908	2421	18487	7145	7499	354	72
73	Kanpur Dehat	16075	2882	13193	5667	5667	0	73
74	Ayodhya	20357	3124	17233	6803	6945	142	74
75	Azamgarh	18738	2364	16374	5910	6079	169	75

\*\*\*Ranking is Based on 85% Weightage on Percentage of Total Grounded Houses Till 31st Jan 2021 w.r.t Revised Sanction ( Patra Beneficiaries Count) and 15% Weightage on the Progress in Month( 1st Jan'21 to 31st Jan'21)

# District Wise Ranking (2nd Installment)

Progress Report of Total 2nd Installment Paid in a Month (1st Jan 2021 to 31st January 2021)								
Sr. No.	District	Sanctioned DU's	Curtailement count (Tentative Apatra Count )	Revised Sanctioned DU's (Patra Count)	Total 2nd installment Paid Till 1st Jan 2021	Total 2nd installment Paid Till 31st Jan 2021	Total Progress( During 1st Jan to 31st Jan 2021)	Rank
1	Sitapur	28838	4677	24161	15584	17552	1968	1
2	Varanasi	26544	7777	18767	14863	15343	480	2
3	Lucknow	26651	5984	20667	14217	15114	897	3
4	Amroha	17865	7212	10653	8399	8399	0	4
5	Gorakhpur	43446	11677	31769	23022	23508	486	5
6	Lakhimpur Kheri	24656	1871	22785	15001	15923	922	6
7	Firozabad	46113	14452	31661	21923	22531	608	7
8	Ghazipur	14396	5605	8791	5312	6021	709	8
9	Ghaziabad	32029	7340	24689	17033	17408	375	9
10	Hardoi	15670	938	14732	9418	9860	442	10
11	Fatehpur	12127	4112	8015	4754	5280	526	11
12	Gonda	7800	2630	5170	3584	3627	43	12
13	Banda	17169	2865	14304	7935	8837	902	13
14	Hathras	11964	4657	7307	5105	5105	0	14
15	Shamli	20831	5239	15592	9702	10193	491	15
16	Meerut	20550	6150	14400	10031	10031	0	16
17	Lalitpur	18392	2671	15721	10930	10930	0	17
18	Muzzaffarnagar	23244	6260	16984	10906	11032	126	18
19	Farrukhabad	7045	725	6320	4173	4173	0	19
20	Gautam Buddha Nagar	2181	397	1784	1148	1148	0	20
21	Etawah	7609	1628	5981	3715	3790	75	21
22	Agra	49593	6849	42744	19274	20923	1649	22
23	Kanpur Nagar	11355	1762	9593	6088	6088	0	23
24	Kushinagar	37322	4212	33110	13986	15679	1693	24
25	Maharajganj	17629	1482	16147	6806	8149	1343	25
26	Jalaun	16780	3295	13485	7068	7609	541	26
27	Bulandshahr	41087	3864	37223	20944	21333	389	27
28	Shrawasti	5731	570	5161	3137	3137	0	28
29	Rae Bareli	11228	3061	8167	4929	4929	0	29
30	Moradabad	27862	7560	20302	11960	11997	37	30
31	Bijnor	34328	6574	27754	13469	14331	862	31
32	Baghpat	10513	799	9714	5704	5717	13	32
33	Jhansi	29628	2642	26986	15240	15391	151	33
34	Kasganj	12200	2863	9337	5445	5445	0	34
35	Saharanpur	31559	7543	24016	10629	11671	1042	35
36	Prayagraj	20961	5366	15595	8709	8836	127	36
37	Mirzapur	37838	6416	31422	13090	14366	1276	37
38	Sonbhadra	11265	588	10677	5485	5745	260	38
39	Bara Banki	18959	3550	15409	7946	8213	267	39
40	Auraiya	11718	2611	9107	5057	5057	0	40

# District Wise Ranking (2nd Installment)

Progress Report of Total 2nd Installment Paid in a Month (1st Jan 2021 to 31st January 2021)								
Sr. No.	District	Sanctioned DU's	Curtailement count (Tentative Apatra Count )	Revised Sanctioned DU's (Patra Count)	Total 2nd installment Paid Till 1st Jan 2021	Total 2nd installment Paid Till 31st Jan 2021	Total Progress( During 1st Jan to 31st Jan 2021)	Rank
41	Shahjahanpur	16114	887	15227	5963	6952	989	41
42	Sultanpur	6975	1764	5211	2669	2781	112	42
43	Ambedkar Nagar	16136	1511	14625	7634	7771	137	43
44	Unnao	29058	3418	25640	13230	13408	178	44
45	Pilibhit	22807	1849	20958	11137	11137	0	45
46	Aligarh	29361	6040	23321	11949	12081	132	46
47	Bahraich	12323	2323	10000	4739	5029	290	47
48	Deoria	25796	2712	23084	12051	12091	40	48
49	Basti	16709	2557	14152	6640	6974	334	49
50	Mainpuri	17162	3802	13360	6321	6619	298	50
51	Amethi	7254	667	6587	2815	3186	371	51
52	Hamirpur	10229	1835	8394	4298	4314	16	52
53	Mau	19886	1526	18360	8824	8875	51	53
54	Chitrakoot	6935	279	6656	3051	3153	102	54
55	Mathura	35377	3590	31787	14165	14454	289	55
56	Chandauli	13278	3063	10215	4386	4555	169	56
57	Sambhal	9125	1663	7462	3225	3326	101	57
58	Hapur	8012	925	7087	3193	3201	8	58
59	Budaun	17515	344	17171	7466	7549	83	59
60	Bhadohi	31607	2853	28754	11010	11463	453	60
61	Ballia	24713	2595	22118	9688	9688	0	61
62	Ayodhya	20357	3124	17233	5060	6029	969	62
63	Bareilly	23277	2860	20417	7461	7972	511	63
64	Kannauj	11202	2850	8352	3642	3642	0	64
65	Pratapgarh	14091	2253	11838	5105	5105	0	65
66	Mahoba	14601	1466	13135	5571	5589	18	66
67	Kaushambi	12755	1428	11327	4734	4772	38	67
68	Sant kabir nagar	20908	2421	18487	6059	6714	655	68
69	Rampur	23319	1996	21323	8169	8169	0	69
70	Etah	9761	1699	8062	2981	2995	14	70
71	Azamgarh	18738	2364	16374	5686	5756	70	71
72	Siddharthnagar	12557	2246	10311	3592	3592	0	72
73	Jaunpur	28867	1572	27295	7918	8223	305	73
74	Kanpur Dehat	16075	2882	13193	4067	4067	0	74
75	Balrampur	5318	427	4891	1180	1180	0	75

\*\*\*Ranking is Based on 85% Weightage on Percentage of Total 2nd Installment Paid Till 31st Jan 2021 w.r.t Revised Sanction ( Patra Beneficiaries Count) and 15% Weightage on the Progress in Month( 1st Jan'21 to 31st Jan'21)

# District Wise Ranking

## (Roof Level Geotag)

Progress Report of Total Roof Level Geotag in a Month (1st Jan 2021 to 31st January 2021)								
Sr. No.	District	Sanctioned DU's	Curtailment count ( tentative Apatra Count )	Revised Sanctioned DU's (Patra Count)	Total Roof Level Geotag Done Till 1st Jan 2021	Total Roof Level Geotag Done Till 31st Jan 2021	Total Progress( During 1st Jan to 31st Jan 2021)	Rank
1	Varanasi	26544	7777	18767	12465	13545	1080	1
2	Lucknow	26651	5984	20667	11087	12786	1699	2
3	Gorakhpur	43446	11677	31769	16767	18503	1736	3
4	Lakhimpur Kheri	24656	1871	22785	11459	12992	1533	4
5	Ghaziabad	32029	7340	24689	13286	14514	1228	5
6	Amroha	17865	7212	10653	6904	7173	269	6
7	Gonda	7800	2630	5170	3215	3294	79	7
8	Sitapur	28838	4677	24161	14043	14408	365	8
9	Firozabad	46113	14452	31661	16496	17276	780	9
10	Muzaffarnagar	23244	6260	16984	9840	10084	244	10
11	Kanpur Nagar	11355	1762	9593	5009	5426	417	11
12	Shamli	20831	5239	15592	8793	9019	226	12
13	Gautam Buddha Nagar	2181	397	1784	1056	1065	9	13
14	Etawah	7609	1628	5981	3445	3517	72	14
15	Hardoi	15670	938	14732	7586	8014	428	15
16	Farrukhabad	7045	725	6320	3507	3626	119	16
17	Rae Bareli	11228	3061	8167	4246	4471	225	17
18	Fatehpur	12127	4112	8015	4280	4407	127	18
19	Lalitpur	18392	2671	15721	8321	8509	188	19
20	Ghazipur	14396	5605	8791	4705	4792	87	20
21	Kasganj	12200	2863	9337	5030	5088	58	21
22	Meerut	20550	6150	14400	7537	7684	147	22
23	Prayagraj	20961	5366	15595	7283	7743	460	23
24	Moradabad	27862	7560	20302	10170	10445	275	24
25	Hathras	11964	4657	7307	3727	3856	129	25
26	Banda	17169	2865	14304	7166	7266	100	26
27	Bulandshahr	41087	3864	37223	17881	18173	292	27
28	Baghpat	10513	799	9714	4702	4796	94	28
29	Hamirpur	10229	1835	8394	3924	3988	64	29
30	Sultanpur	6975	1764	5211	2357	2412	55	30
31	Bara Banki	18959	3550	15409	6496	6765	269	31
32	Bahraich	12323	2323	10000	4516	4562	46	32
33	Mau	19886	1526	18360	7904	8097	193	33
34	Agra	49593	6849	42744	17653	18021	368	34
35	Deoria	25796	2712	23084	9422	9765	343	35
36	Jalaun	16780	3295	13485	5557	5790	233	36
37	Jhansi	29628	2642	26986	10842	11175	333	37
38	Aligarh	29361	6040	23321	9106	9501	395	38
39	Unnao	29058	3418	25640	11156	11226	70	39
40	Pilibhit	22807	1849	20958	8902	9037	135	40



# District Wise Ranking

## (Roof Level Geotag)

Progress Report of Total Roof Level Geotag in a Month (1st Jan 2021 to 31st January 2021)								
Sr. No.	District	Sanctioned DU's	Curtailement count ( tentative Apatra Count )	Revised Sanctioned DU's (Patra Count)	Total Roof Level Geotag Done Till 1st Jan 2021	Total Roof Level Geotag Done Till 31st Jan 2021	Total Progress( During 1st Jan to 31st Jan 2021)	Rank
41	Basti	16709	2557	14152	5775	5948	173	41
42	Saharanpur	31559	7543	24016	9617	9875	258	42
43	Hapur	8012	925	7087	2975	3020	45	43
44	Ambedkar Nagar	16136	1511	14625	5568	5858	290	44
45	Bijnor	34328	6574	27754	10065	10529	464	45
46	Kushinagar	37322	4212	33110	10347	11182	835	46
47	Shrawasti	5731	570	5161	2154	2163	9	47
48	Sonbhadra	11265	588	10677	4034	4241	207	48
49	Mainpuri	17162	3802	13360	5180	5338	158	49
50	Amethi	7254	667	6587	2528	2640	112	50
51	Mahoba	14601	1466	13135	4621	4935	314	51
52	Ballia	24713	2595	22118	8744	8822	78	52
53	Chitrakoot	6935	279	6656	2629	2667	38	53
54	Maharajganj	17629	1482	16147	5979	6186	207	54
55	Mathura	35377	3590	31787	8812	9748	936	55
56	Kaushambi	12755	1428	11327	4197	4321	124	56
57	Rampur	23319	1996	21323	7094	7504	410	57
58	Pratapgarh	14091	2253	11838	4388	4442	54	58
59	Mirzapur	37838	6416	31422	11113	11306	193	59
60	Sambhal	9125	1663	7462	2657	2722	65	60
61	Chandauli	13278	3063	10215	3456	3611	155	61
62	Auraiya	11718	2611	9107	3204	3232	28	62
63	Budaun	17515	344	17171	5633	5789	156	63
64	Bhadohi	31607	2853	28754	8150	8600	450	64
65	Etah	9761	1699	8062	2671	2696	25	65
66	Azamgarh	18738	2364	16374	5415	5446	31	66
67	Kannauj	11202	2850	8352	2413	2598	185	67
68	Siddharthnagar	12557	2246	10311	3228	3290	62	68
69	Bareilly	23277	2860	20417	5255	5610	355	69
70	Shahjahanpur	16114	887	15227	4382	4491	109	70
71	Kanpur Dehat	16075	2882	13193	3291	3527	236	71
72	Sant kabir nagar	20908	2421	18487	4955	5085	130	72
73	Ayodhya	20357	3124	17233	4565	4687	122	73
74	Jaunpur	28867	1572	27295	6254	6455	201	74
75	Balrampur	5318	427	4891	1179	1187	8	75

\*\*\*Ranking is Based on 85% Weightage on Percentage of Total Roof Level Geotag Till 31st Jan 2021 w.r.t Revised Sanction ( Patra Beneficiaries Count) and 15% Weightage on the Progress in Month( 1st Jan'21 to 31st Jan'21)

# District Wise Ranking (All Level Geotag)

Progress Report of Complete Level Geotag in a Month (1st Jan 2021 to 31st January 2021)								
Sr. No	District	Sanctioned DU's	Curtailement count (tentative Apatra Count )	Revised Sanctioned DU's (Patra Count)	Complete Level Geotag till 31st Jan 2021	Complete Level Geotag till 31st Jan 2021	Total Progress( During 1st Jan to 31st Jan 2021)	Rank
1	Varanasi	26544	7777	18767	9876	11013	1137	1
2	Lakhimpur Kheri	24656	1871	22785	9078	11159	2081	2
3	Lucknow	26651	5984	20667	6276	8622	2346	3
4	Ghaziabad	32029	7340	24689	9867	11434	1567	4
5	Gonda	7800	2630	5170	2845	2933	88	5
6	Amroha	17865	7212	10653	5120	5668	548	6
7	Muzzaffarnagar	23244	6260	16984	9146	9322	176	7
8	Shamli	20831	5239	15592	7677	7935	258	8
9	Gorakhpur	43446	11677	31769	9998	11998	2000	9
10	Kasganj	12200	2863	9337	4646	4738	92	10
11	Sitapur	28838	4677	24161	10166	10742	576	11
12	Hathras	11964	4657	7307	3179	3365	186	12
13	Etawah	7609	1628	5981	2569	2680	111	13
14	Firozabad	46113	14452	31661	11778	12530	752	14
15	Hamirpur	10229	1835	8394	3477	3652	175	15
16	Fatehpur	12127	4112	8015	3058	3325	267	16
17	Bara Banki	18959	3550	15409	5758	6188	430	17
18	Banda	17169	2865	14304	5425	5777	352	18
19	Mau	19886	1526	18360	7227	7500	273	19
20	Meerut	20550	6150	14400	5601	5869	268	20
21	Gautam Buddha Nagar	2181	397	1784	737	746	9	21
22	Bahraich	12323	2323	10000	3948	4060	112	22
23	Bulandshahr	41087	3864	37223	13074	13672	598	23
24	Hardoi	15670	938	14732	5204	5594	390	24
25	Rae Bareli	11228	3061	8167	3019	3214	195	25
26	Moradabad	27862	7560	20302	6758	7343	585	26
27	Basti	16709	2557	14152	5230	5475	245	27
28	Saharanpur	31559	7543	24016	8555	8879	324	28
29	Farrukhabad	7045	725	6320	2284	2399	115	29
30	Lalitpur	18392	2671	15721	5476	5752	276	30
31	Ghazipur	14396	5605	8791	3139	3256	117	31
32	Deoria	25796	2712	23084	7587	7975	388	32
33	Jalaun	16780	3295	13485	4553	4790	237	33
34	Jhansi	29628	2642	26986	8669	9119	450	34
35	Prayagraj	20961	5366	15595	4874	5292	418	35
36	Sonbhadra	11265	588	10677	3380	3680	300	36
37	Agra	49593	6849	42744	13091	13688	597	37
38	Ballia	24713	2595	22118	7159	7467	308	38
39	Maharajganj	17629	1482	16147	4674	5169	495	39
40	Mirzapur	37838	6416	31422	10653	10794	141	40

# District Wise Ranking (All Level Geotag)

Progress Report of Complete Level Geotag in a Month (1st Jan 2021 to 31st January 2021)								
Sr. No	District	Sanctioned DU's	Curtailement count (tentative Apatra Count )	Revised Sanctioned DU's (Patra Count)	Complete Level Geotag till 31st Jan 2021	Complete Level Geotag till 31st Jan 2021	Total Progress( During 1st Jan to 31st Jan 2021)	Rank
41	Pilibhit	22807	1849	20958	6301	6727	426	41
42	Unnao	29058	3418	25640	8117	8436	319	42
43	Amethi	7254	667	6587	2128	2259	131	43
44	Ambedkar Nagar	16136	1511	14625	4644	4885	241	44
45	Azamgarh	18738	2364	16374	5223	5316	93	45
46	Aligarh	29361	6040	23321	6041	6651	610	46
47	Mainpuri	17162	3802	13360	3785	4067	282	47
48	Chitrakoot	6935	279	6656	1996	2049	53	48
49	Etah	9761	1699	8062	2385	2460	75	49
50	Kaushambi	12755	1428	11327	3122	3334	212	50
51	Hapur	8012	925	7087	2072	2146	74	51
52	Kanpur Nagar	11355	1762	9593	2352	2629	277	52
53	Mahoba	14601	1466	13135	3438	3653	215	53
54	Rampur	23319	1996	21323	5064	5462	398	54
55	Bhadohi	31607	2853	28754	6376	6930	554	55
56	Sambhal	9125	1663	7462	1865	1974	109	56
57	Chandauli	13278	3063	10215	2541	2673	132	57
58	Baghpat	10513	799	9714	2409	2535	126	58
59	Bijnor	34328	6574	27754	5258	5981	723	59
60	Shahjahanpur	16114	887	15227	3768	3926	158	60
61	Bareilly	23277	2860	20417	3712	4395	683	61
62	Shrawasti	5731	570	5161	1368	1369	1	62
63	Pratapgarh	14091	2253	11838	2780	2945	165	63
64	Siddharthnagar	12557	2246	10311	2526	2614	88	64
65	Kushinagar	37322	4212	33110	6300	6803	503	65
66	Sultanpur	6975	1764	5211	973	1133	160	66
67	Auraiya	11718	2611	9107	1892	1995	103	67
68	Mathura	35377	3590	31787	5495	5974	479	68
69	Budaun	17515	344	17171	3341	3547	206	69
70	Jaunpur	28867	1572	27295	5144	5437	293	70
71	Sant kabir nagar	20908	2421	18487	3257	3571	314	71
72	Kanpur Dehat	16075	2882	13193	2434	2572	138	72
73	Balrampur	5318	427	4891	947	962	15	73
74	Ayodhya	20357	3124	17233	2998	3102	104	74
75	Kannauj	11202	2850	8352	1040	1212	172	75

\*\*\*Ranking is Based on 85% Weightage on Percentage of Total Complete Level Geotag Till 31st Jan 2021 w.r.t Revised Sanction ( Patra Beneficiaries Count) and 15% Weightage on the Progress in Month( 1st Jan'21 to 31st Jan'21)

## Progress in a Month

5 Best Performing District (Till Date 31st Jan 2021)				
Over all	Total Grounded House Against Sanction	Toal 2nd Installment Paid Against Sanction	Roof Level Geotag Against Sanction	Complete Level Geotag Sanction
District	District	District	District	District
Varanasi	Ghaziabad	Sitapur	Varanasi	Varanasi
Lucknow	Varanasi	Varanasi	Lucknow	Lakhimpur Kheri
Ghaziabad	Sitapur	Lucknow	Gorakhpur	Lucknow
Lakhimpur Kheri	Firozabad	Amroha	Lakhimpur Kheri	Ghaziabad
Sitapur	Lucknow	Gorakhpur	Ghaziabad	Gonda

\*\*\*Ranking is Based on 85% Weightage on Percentage of Total Quantum Till 31st Jan 2021 w.r.t Revised Sanction ( Patra Beneficiaries Count) and 15% Weightage on the Progress in Month( 1st Jan'21 to 31st Jan'21)

# Best House of the Month

Jamana  
Prasad  
Jhansi



Anju  
Rani  
Shamli



Anjana  
Devi  
Shamli



Rita  
Devi  
Varanasi



# IEC Activity of January







राज्य नगरीय विकास अभिकरण  
(सूडा) उ०प्र०

